INVESTOR

Obec Braňany

metrostav infrastructure

metrostav infrastructure

metrostav infrastructure

Stavba : **Braňany Oprava míctních komunikací 2022**

Název položky	od	do
Kalendářní týden		
Pracovní týden		
Zařízení staveniště + vytyčení		
ETAPA I	28.7.	22.8.
Řezání asfaltového krytu - podél silniční obruby		
DMTŽ stávajících silničních betonových obrub		
Zemní práce pro osazení silničních betonových obrub		
Dodávka a rozprostření ŠD v tl. 100mm (rýha pro silniční obruby)		
Dodávka a mtž silničních betonových obrub vč. dodávky betonu		
Frézování v tl. Do 50mm vč odbourání		
Sanační práce - výměna nevhodných konstrukčních vrstev		
Prořízntutí a zalití trhlin na podkladních vrstvách (odhad)		
DMTŽ stávajících poklopů RŠ / UV / šoupat		
Vyčištění RŠ / UV od naplavenin		
Dodávka a osazení samonivelačních poklopů RŠ do rychletuhnoucího betonu		
Vyrovnávka AC		
Pokládka asfaltové vrstvy ACP 16 v tl. 60mm		
Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 40mm		
Úprava deponie - terenní úpravy		
Ošetření pracovních spár		
ETAPA II	12.8.	7.9.
Řezání asfaltového krytu - podél silniční obruby		
DMTŽ stávajících silničních betonových obrub		
Zemní práce pro osazení silničních betonových obrub		
Dodávka a rozprostření ŠD v tl. 100mm (rýha pro silniční obruby)		
Dodávka a mtž silničních betonových obrub vč. dodávky betonu		
Frézování v tl. Do 50mm vč dobourání		
Sanační práce - výměna nevhodných konstrukčních vrstev		
Prořízntutí a zalití trhlin na podkladních vrstvách (odhad)		
DMTŽ stávajících poklopů RŠ / UV / šoupat		
Vyčištění RŠ / UV od naplavenin		
Dodávka a osazení samonivelačních poklopů RŠ do rychletuhnoucího betonu		
Vyrovnávka AC		
Pokládka asfaltové vrstvy ACP 16 v tl. 60mm		
Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 40mm		
Úprava deponie + terénní úpravy		
Ošetření pracovních spár		
VDZ + SDZ		

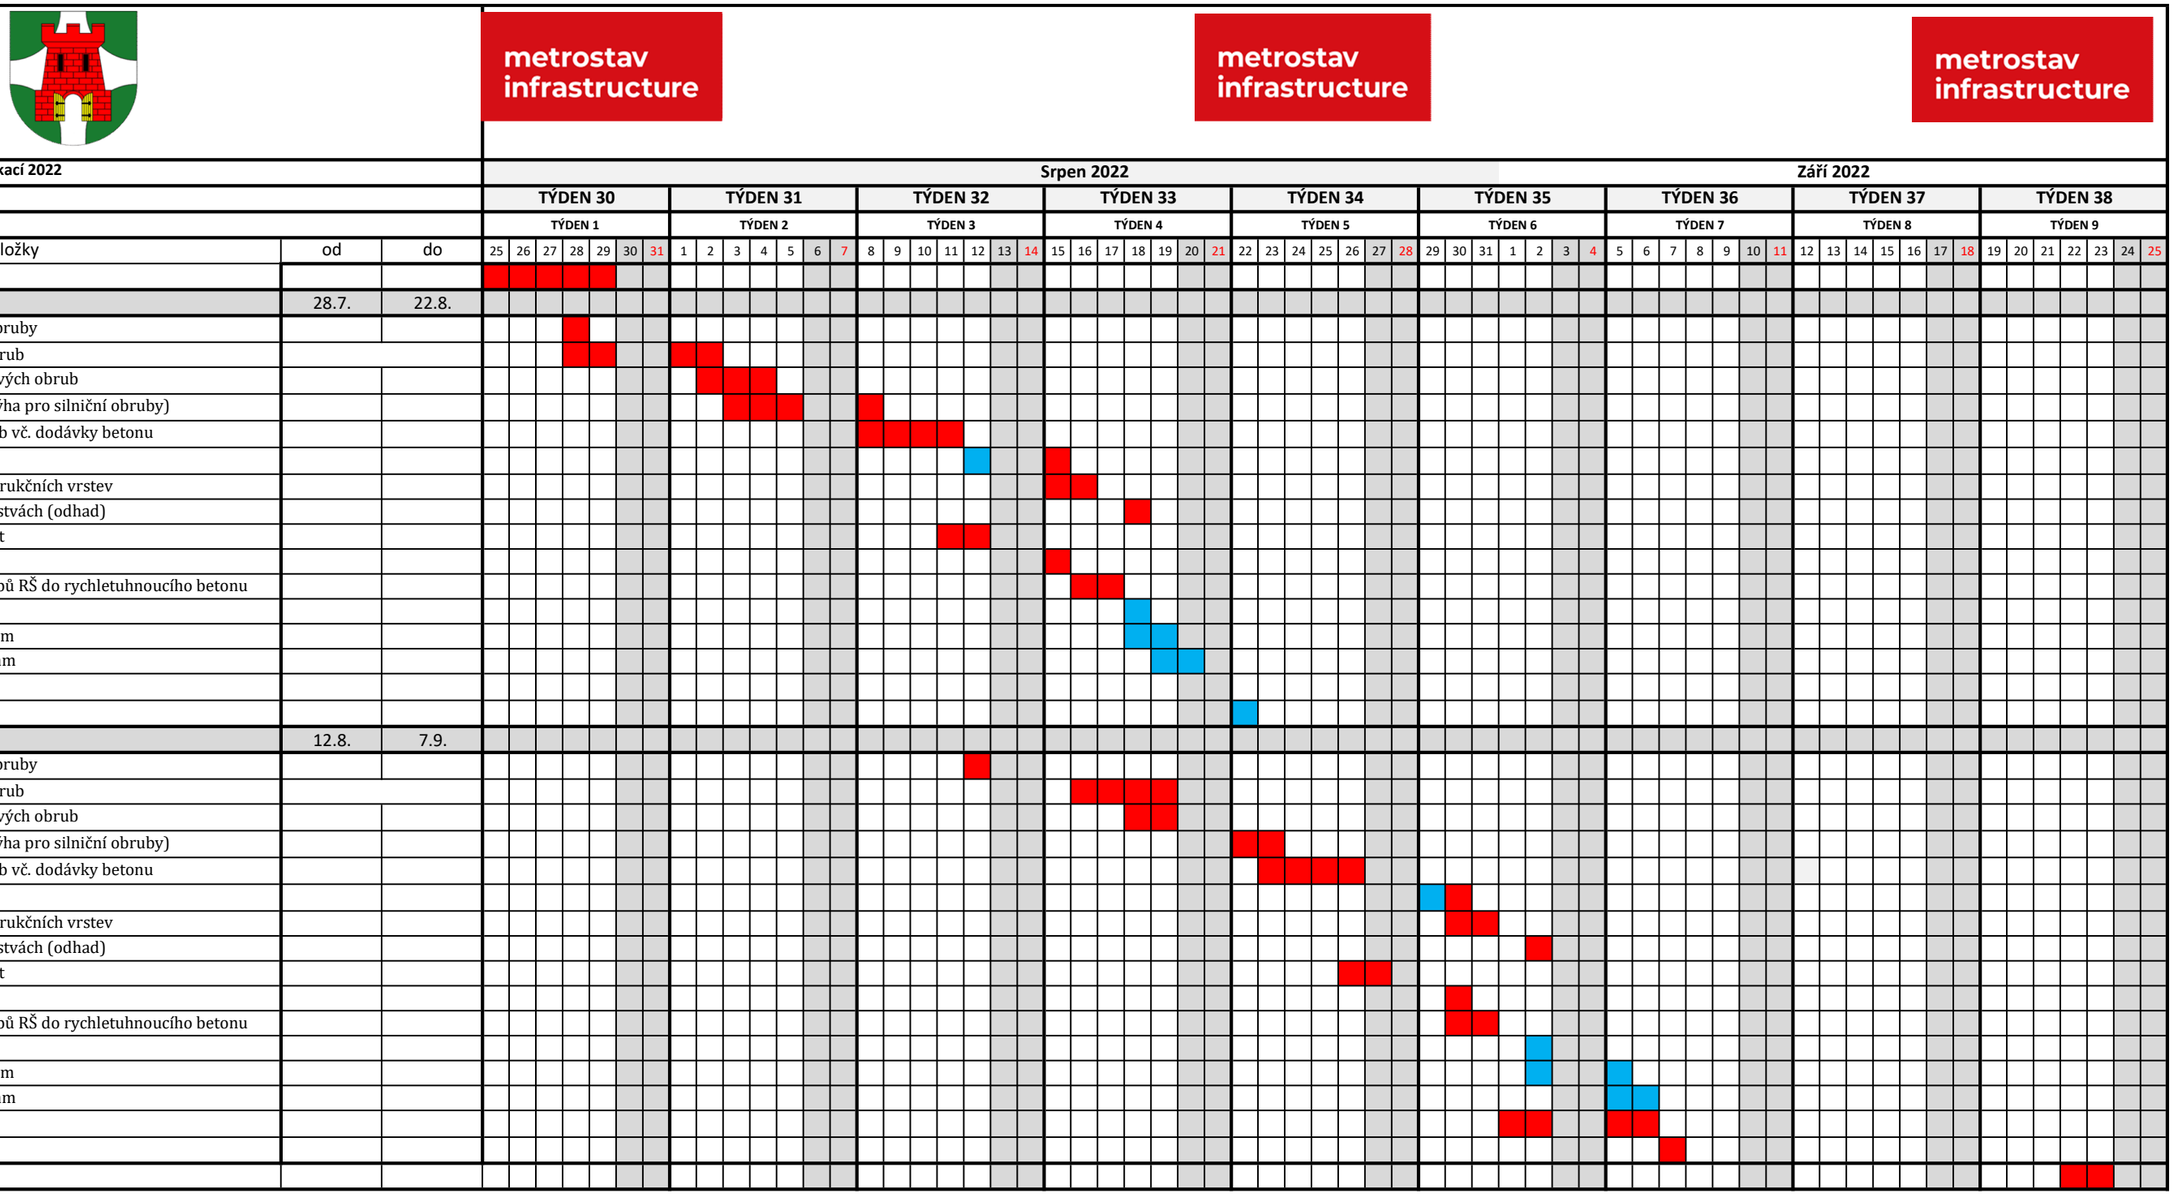

Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na klimatických podmínkách a práce nad rámec projektové dokumentace.

Aktualizace : 25.7.2022
